


## ブラケットと箱物で受けるダイニング L 字カウンターの製作について

今回の依頼はキッチンと隣合わせのダイニングにウォールナット剥ぎ板の L 字カウンターを取り付けるものです。そこで、一部にカウンター下部収納があり、下部収納の無い箇所は天板をブラケットにて受けることになりました。

L 字カウンターの取り付けにあたり配慮点として


1. ブラケットの三角リブは壁内に収める。
2. カウンター天板のトメ接合は接合金物とビスケット固定の併用とする。
3. 天板のトメ接合箇所は収納にて受けるものとする。
4. 間柱、柱に受け板を設けてその上に間柱、柱部を切り欠いた天板を差込み、差込み部より受け板にビス固定し、さらに天板上に押さえ板を間柱、柱に固定します。  
できる限り揺れ等を少なく、ブラケットを目立たない納め方で進めます。

ダイニング L 字カウンター平面図

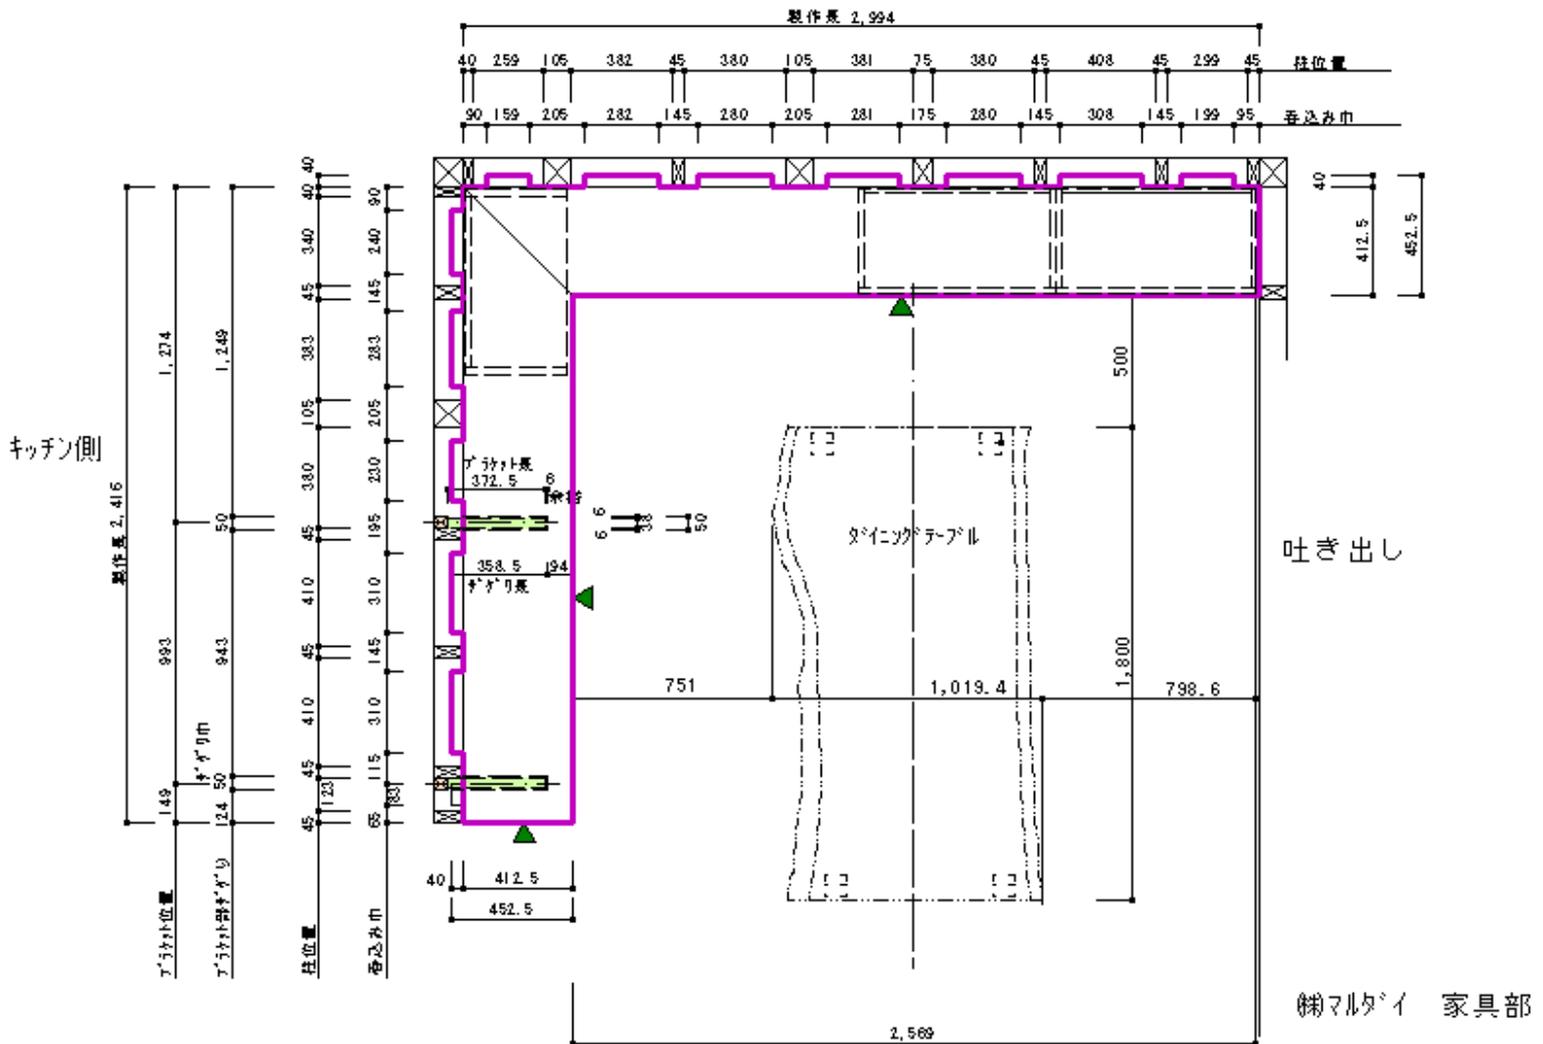




ブラケット取り付け状況。

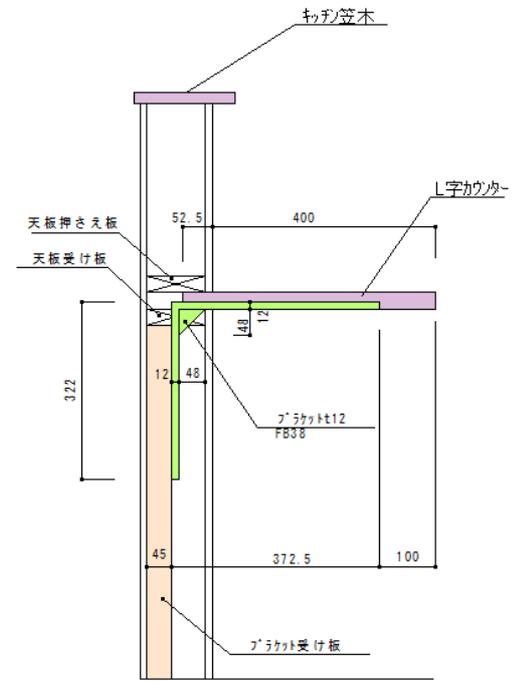

天板の壁呑込み状況。

コーナートメ接合部の表、裏の状況。

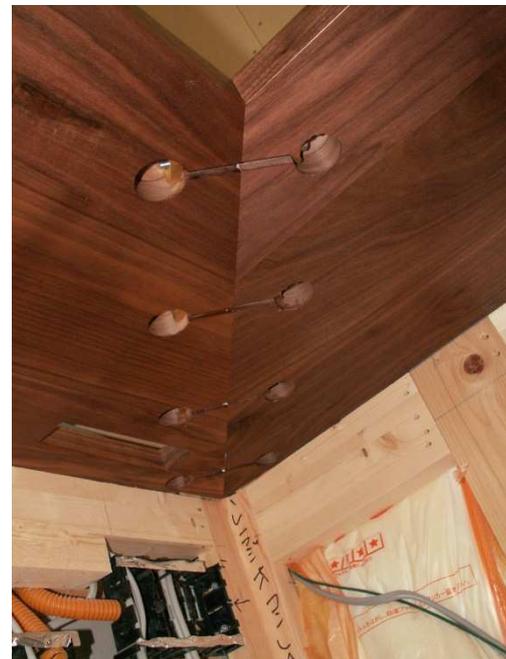



ブラケット取り付け状況。



ウォールナット剥ぎ板（3枚剥ぎ）状況。



コーナー部取り付け状況。



カウンター下収納取り付け状況。





L字カウンターの完成です。



予定通りのウォールナット1枚板のダイニングテーブルが納まりました。

(株)マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木

平成24年9月18日
