

# 三面ミラー収納付き 2連ボウルの洗面台の製作について

今回の依頼は三面ミラー収納付きで2連ボウルの洗面台の製作です。

天板、ボウルは人工大理石で箱物外装はウレタン塗装の白色で塗り潰しの仕上げです。

以下、仕様、確定図面です。

### \*\*\*仕様\*\*\*

天板：人大ABC商会エコーリネ ビューホワイト

ボウル：コーラン810 2連グレイシアホワイト（ビューホワイト近似色）

前板、扉、幕板、ミラー収納上下面、右側板：化粧 右側板背面延ばし

塗装：日塗工 N-90 50%艶消し

ミラー下面：メタミン白貼り

箱内部：ポリ5414 扉：ダンパー付き

手掛け：彫り手


下箱：ワイヤバスケット収納2段（ローラー）

引き出し：普通3段スライドレール

混合栓：グローエ 32909001\*2セット

（小さい引き出しのため）

排水金具：INAX LF-71SAC\*2セット

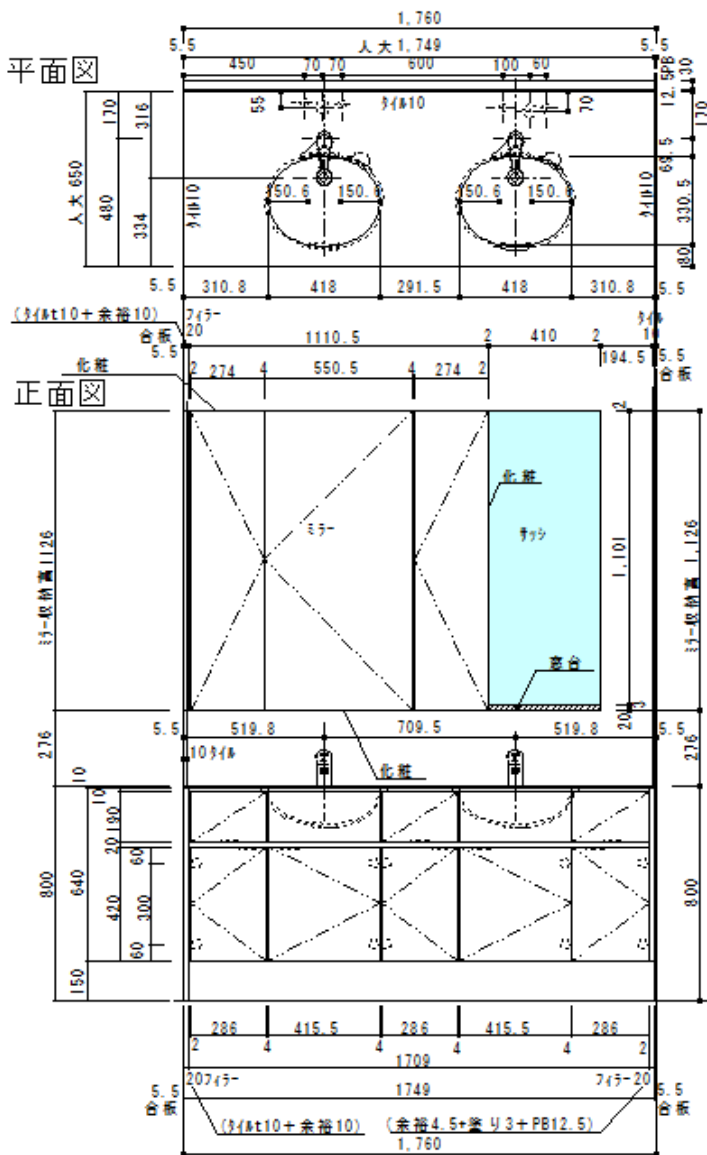

## 確定図 1F 洗面台

ミラー収納図：別途有り。 三好様承認S=1/15

### \*\*\*仕様\*\*\*

天板：人大ABC商会エコーリネ ビューホワイト

ボウル：コーラン810 2連グレイシアホワイト（ビューホワイト近似色）

前板、扉、幕板、ミラー収納上下面、右側板：化粧 右側板背面延ばし

塗装：日塗工 N-90 50%艶消し

ミラー下面：メタミン白貼り

箱内部：ポリ5414 扉：ダンパー付き

手掛け：彫り手

下箱：ワイヤバスケット収納2段（ローラー）

引き出し：普通3段スライドレール


混合栓：グローエ 32909001\*2セット

（小さい引き出しのため）

排水金具：INAX LF-71SAC\*2セット

### 断面図

### 断面図

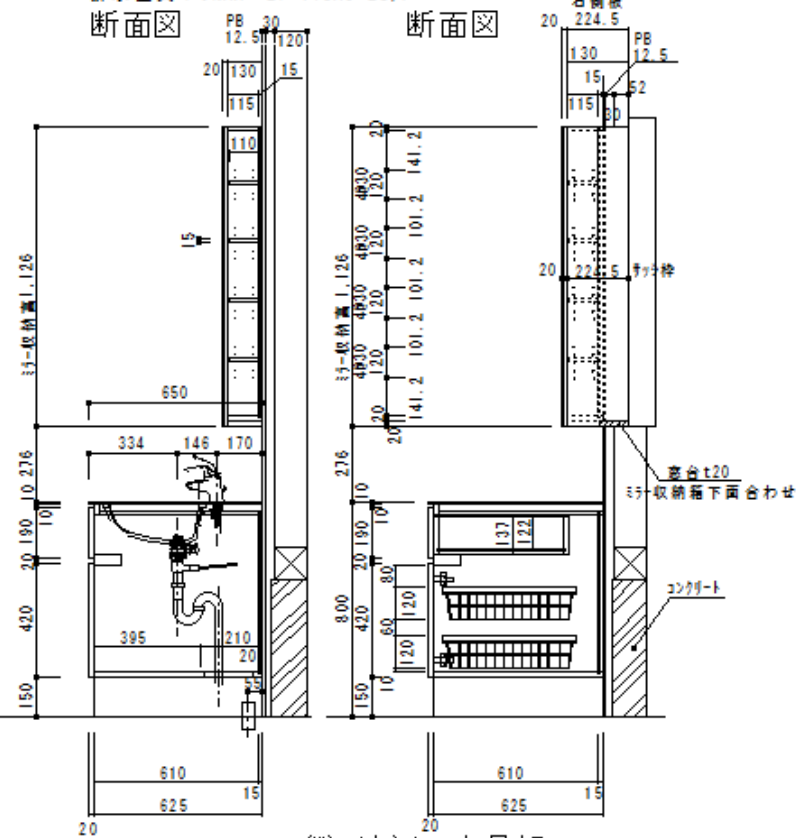

(株)マルタイ 家具部 平成25年5月12日


# 確定図 1F 洗面台内装図

35-収納図：別途有り。


S=1/15 三好様承認

\*\*\*仕様\*\*\*


天板：人工大理石 ABC商会 エコアール ピュアホワイト  
 ボウル：カラー810 2連 グレイホワイト (ピュアホワイト近似色)  
 前板、扉、蓋板、35-収納上下面、右側板：化粧 右側板背面延ばし  
 塗装：日塗工 N-90 50%艶消し 35-下面：55%白貼り  
 箱内部：#R15414 扉：ダブル付き 手掛け：彫り手  
 下箱：ワイド幅収納2段 (0-5) 引き出し：普通3段35ドレール  
 混合栓：クローイ 32909001\*2セット (小さい引き出しのため)  
 排水金具：INAX LF-71SAC\*2セット

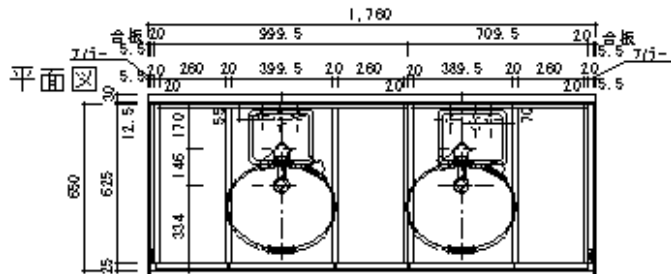

## 内部正面図

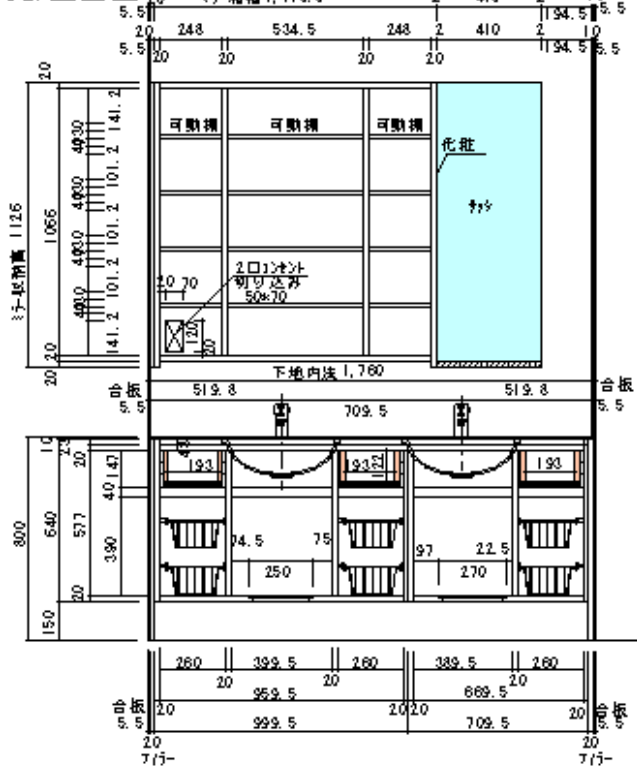


## 断面図

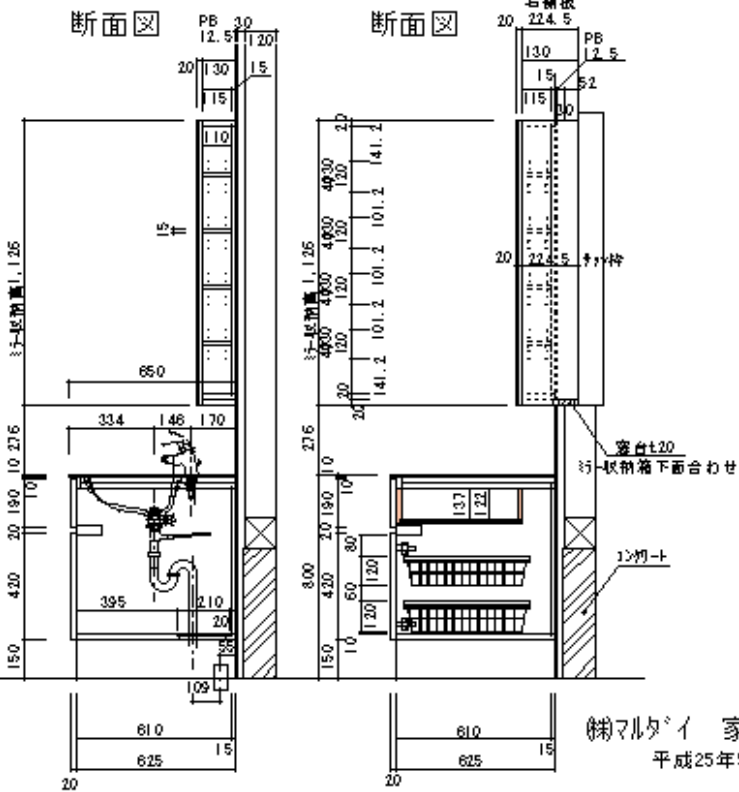

(株)マルタイ 家具部  
 平成25年5月12日

## 1F洗面台天板加工図 S=1/15

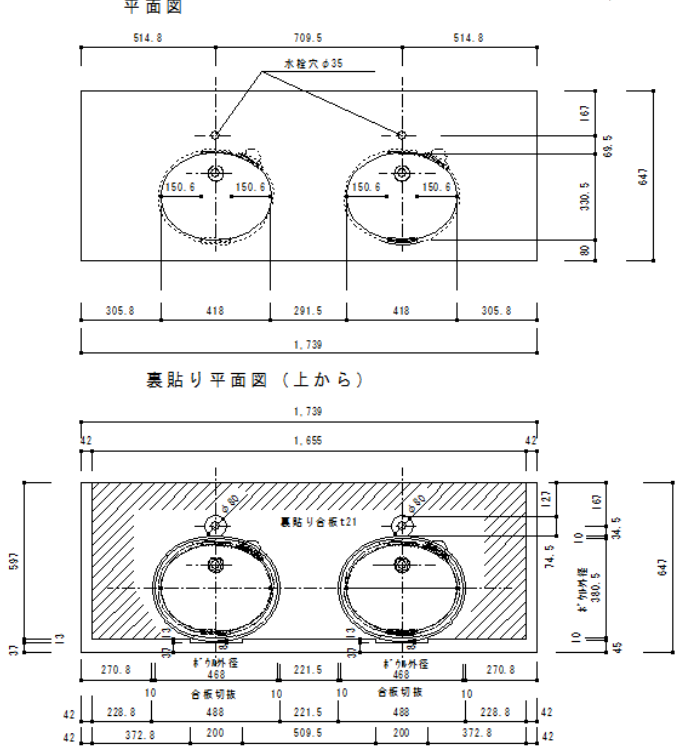


## 藤本様邸 1F洗面台天板加工図

\*\*\*仕様\*\*\*

天板：人工大理石 ABC商会 エコアール ピュアホワイト  
 ボウル：カラー810 2連 グレイホワイト  
 水栓：クローイ 32909001 水栓穴 $\phi 35$ 、締め付けtMax30

## 拡大断面図

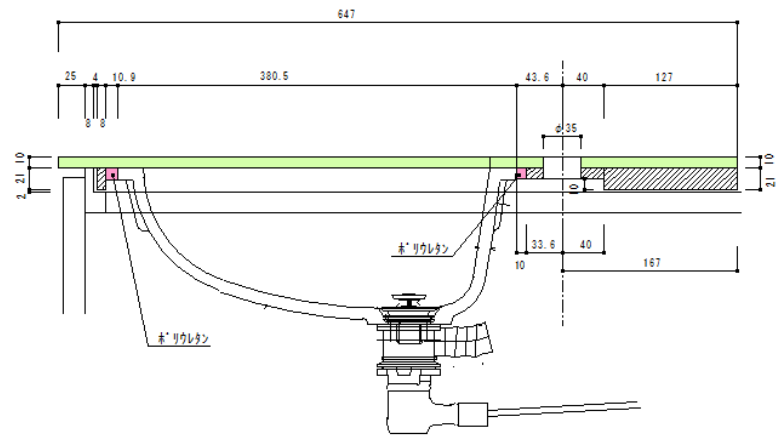

(株)マルタイ 家具部 平成25年5月20日

1. 取り付け前、採寸時状況。



2. 組立



三面ミラー収納を取り付け、カウンター部箱組完了、人大天板セット前の状況。




合板とボウルの隙間約 10mm にポリウレタンを流しボウルを固定。



人大天板を取り付け後、引き出し、扉を取り付けてオープン状況の確認。

3. 仕上がり。

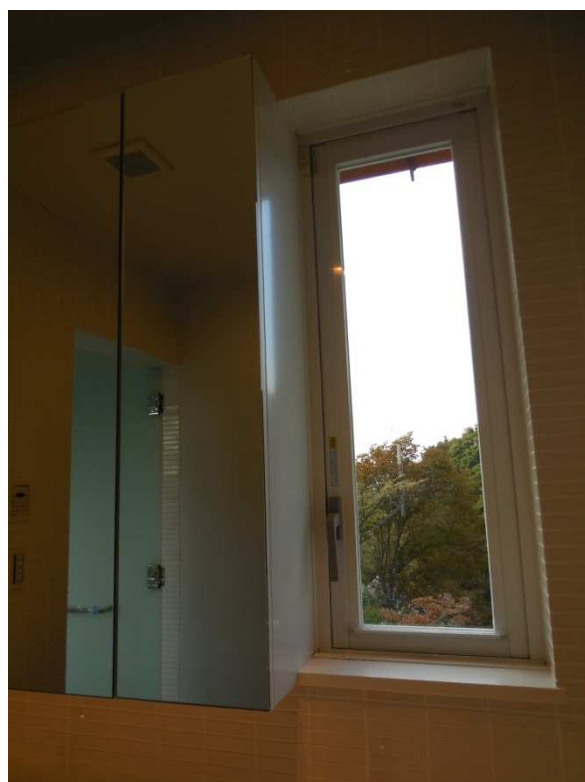

三面ミラー収納の右側板と窓枠の収まり状況。

三面ミラー収納オープン状況。



カウンター部全景。



三面ミラーの高さは窓枠に合わせて右側板が窓枠を呑込みこませて枠との接合面をスッキリさせている。



人工大理石の天板、ボウルの一体型は天板面の平坦さが心地よく、さらに前板、扉の手掛けは彫り込みでハンドル等の突起物がなく、引き出し扉の多い割には落ち着いた雰囲気を感じさせる。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木

平成 26 年 1 月 6 日
