

# 三角形の大理石天板のコーナー手洗いについて

今回の依頼はトイレ手洗いのコーナー部に三角形の大理石天板で下部がアルダー突板化粧の開扉収納の製作です。



ここでの大理石天板の納まりは、大理石のバックガード t20 を薄く見せるため、壁に中に 12.5mm (PB プラスターボード厚) 埋め込んで取り付けるものとして仕様、確定図がきまりました。

そこで、大理石加工図通りに石屋さんへ加工してもらい、人工大理石加工工場へ大理石とボウルの固定をお願いしました。

- \*\*\*仕様\*\*\***  
 天板前垂れ：天然大理石 t20  
 変更 BG:t20  
 IB903P4-CUT  
 扉、外装：アルダー突板 横貼り  
 塗装：濃茶 ウレタン艶消し  
 内装：ホリ5414  
 ボウル：ラインス 6162.01.01  
 排水：ラインス 670.870  
 ストラップ：FCST  
 水栓：グローエ 32911001

## 確定図 1F 手洗い

S=1/15


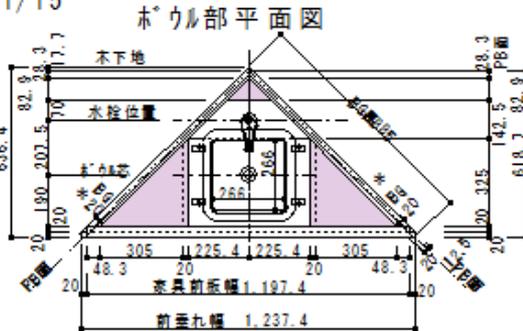
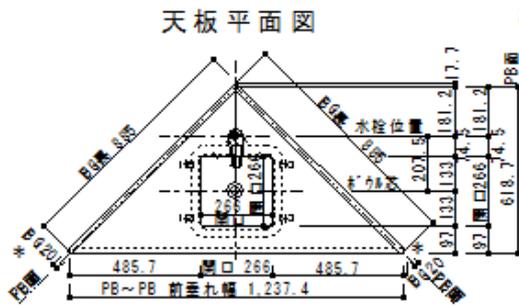


- \*\*\*仕様\*\*\***  
 天板前垂れ：天然大理石 t20  
 変更 BG:t20  
 IB903P4-CUT  
 扉、外装：アルダー突板 横貼り  
 塗装：濃茶 ウレタン艶消し  
 内装：ホリ5414  
 ボウル：ラインス 6162.01.01  
 排水：ラインス 670.870  
 ストラップ：FCST  
 水栓：グローエ 32911001

## 正面図

## 内部正面図

## ボウル部断面図

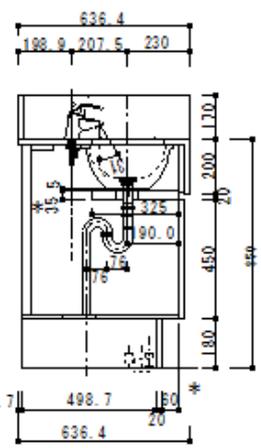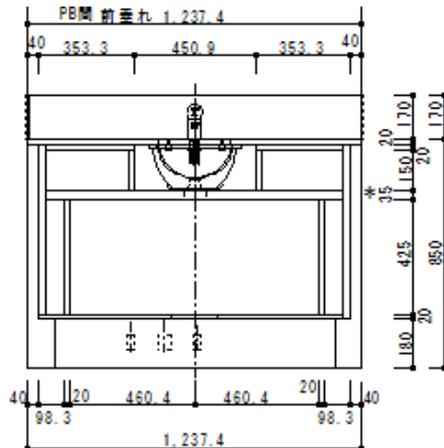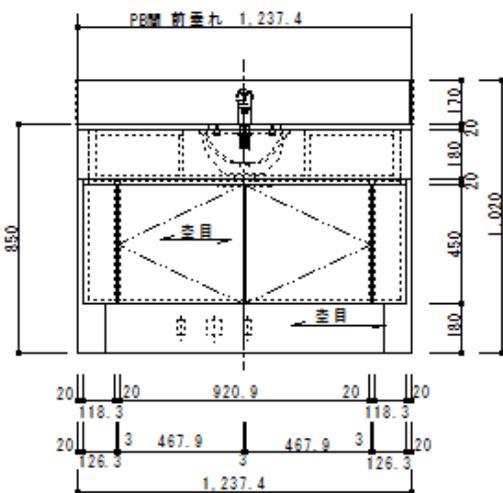

㈱マルタィ 家具部 平成25年1月10日






大理石天板の仕上がり状況です・



この裏面にボウル固定します。  
裏面角にはステンレスアングルの補強があり、  
アングルの突起部分は本体箱側を削り込みます。

4箇所金具止め用の木板を天板に固定し、その木板に金具にてボウルを固定いたします。

ボウルは天板にシリコンで四方を固定します。

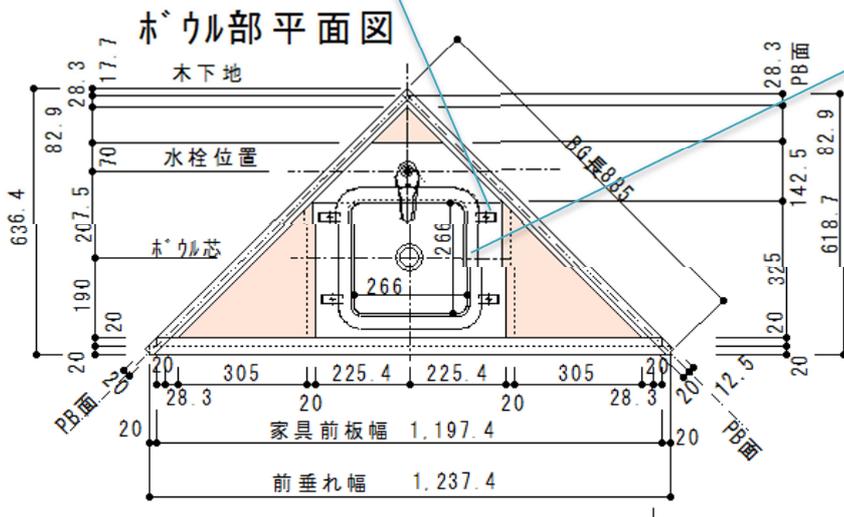



両サイドの FIX 部と中央の開扉の納まり状況です。



収納内部の配管状況です。



予定通り、t20 のバックガードが壁に呑み込まれて天板が多少でも広く感じ、天板も箱本体も綺麗な三角形を形成しております。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木  
平成 25 年 5 月 7 日
