


## 無垢板のリビング TV 棚施工について

今回、無垢の棚板はスッキリした見栄えになるように受け板等を見えにくく納める施工例です。受け板は鋼製ブラケットで石膏ボードに隠れる所までブラケットの火打ちピースを取り付けて少しでも揺れを小さくなるように配慮しました。

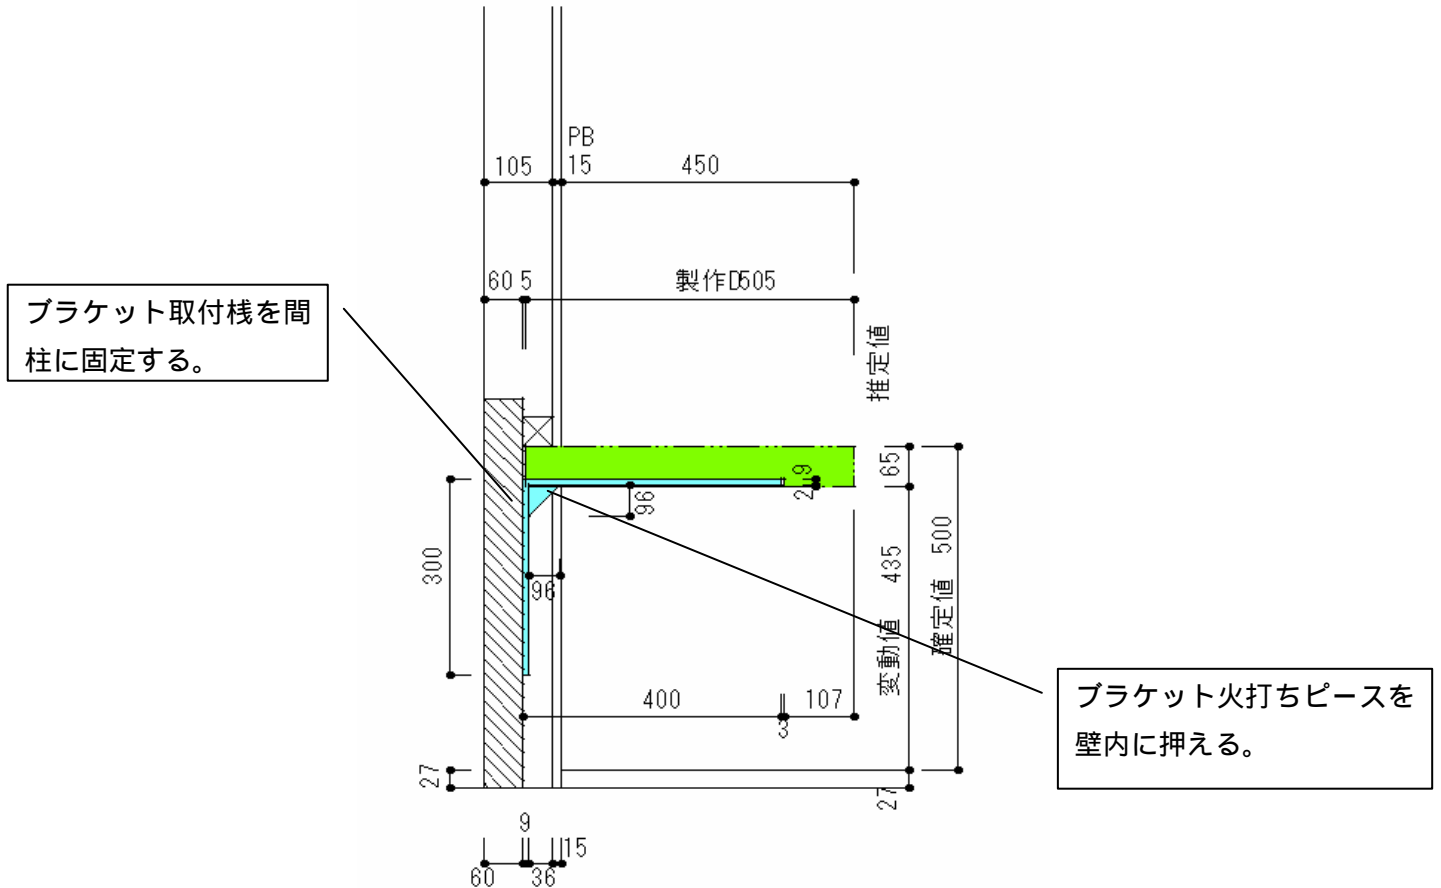

### 1. ヴェンゲ無垢板によるリビング TV 棚

3F の窓下に TV カウンター棚を付けるものです。



ヴェンゲ材は支給品で木取りから NC 加工でブラケット部ザグリ、コンセント穴開けを行い、さらに、3F までの持ち込み、取付を致しました。





L3560\*D505\*T65 の無垢板をユニック車にて 3F のベランダまで吊り上げて入れ込みました。

### 3F TVカウンター 確定図

S=1/15

\*\*\*仕様\*\*\*

材種-材: ヴェンゲ無垢板  
 フラット: t8、黒艶消し  
 フラット-W38\*t8

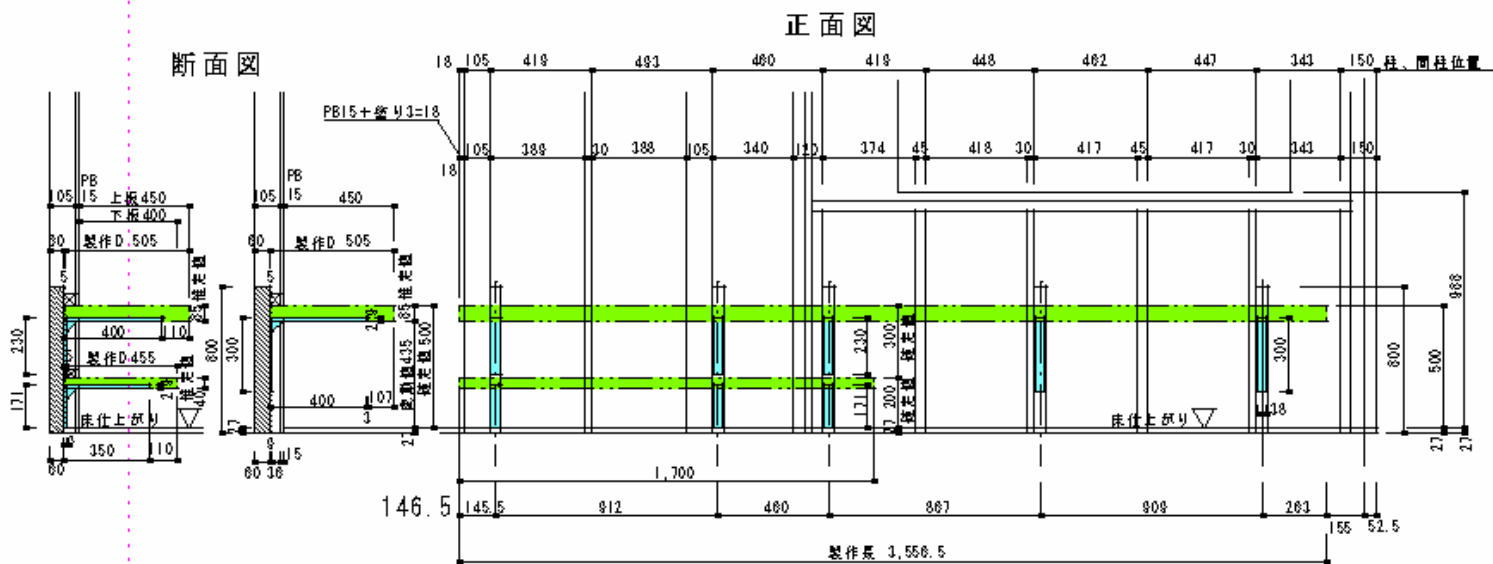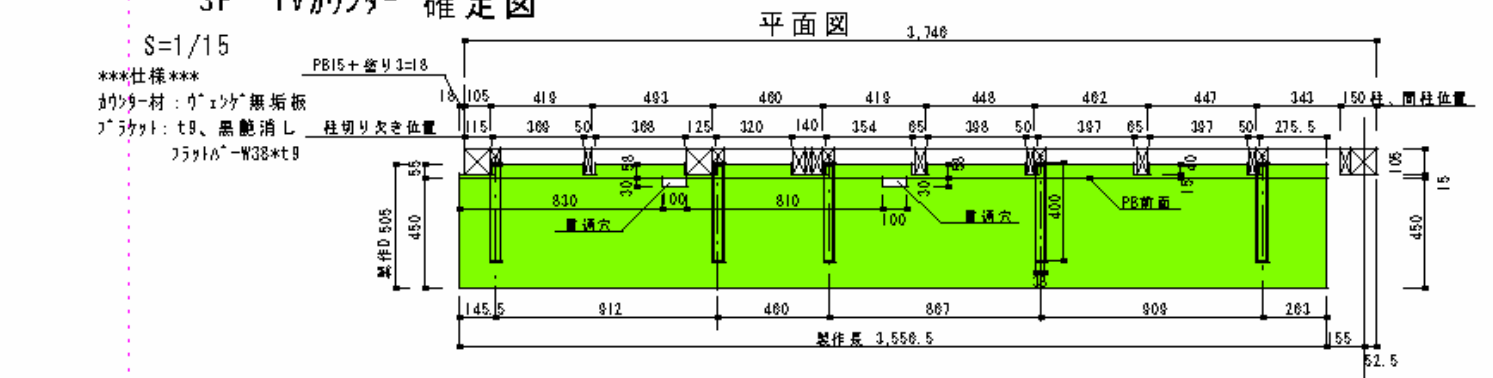

(株)マルタイ 家具部 平成21年9月10日



ヴェンゲ無垢板の  
 両耳カット完了。  
 L3560\*D505\*t65



化粧面小口に虫食い跡。  
 埋め木にて処理。



L3560 の板の虫食い箇所あり(白テープ片)埋め木にて処理。



下段の棚板はシラタの多い部分を壁に呑み込ませる。



ブラケット固定状況です。  
ブラケットはザグリ部にうまく納まっています。  
\*\*\*このザグリとコンセント穴はNC加工です。



火打ちピースを壁に隠れる範囲で大きくしたい。



棚板上部固定状況。

大きめのL金物にて間柱等に固定。

板材の重量がかなりある為、ブラケットだけでは多少の揺れが発生し、板上部の固定で揺れ止まる。



棚板固定完了状況。

壁塗り完了で仕上がり  
状況。

厚い無垢板がスッキリ  
見えます。





板足を付ければ簡単な固定ですが、このような板足が無い場合には無垢板に存在感が加わった気がいたします。

## 2 . ウォールナット無垢板の TV 棚



左側小口は壁呑み込み固定。  
右側は引き戸引き込み部で  
ブラケットにて固定し、さらに  
中央部も撓まぬように同様に固定した。



L4450\*D541\*t60 の 1 枚板です。



天板状況です。



ブラケット部ザグリ加工、ブラケット固定状況。

こんな具合の金物を使用した無垢の棚板取付が増えてきました。そこで、採寸を正確にやることでザグリ、穴あけ加工等を NC で行い、施工性が向上するように努めています。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木

平成 22 年 1 月 6 日
