

タイル壁のオーディオ操作用横格子枠の製作について

今回の依頼は、タイル壁に壁掛け TV を取り付けて、その下のオーディオ部にリモコン操作の出来る程度の横格子を製作し、その格子にもタイルを貼り付けて壁に納めるものです。

今回はあくまでもタイル下地の木部加工と取り付けです。また、タイル職人、コーディネーターさんとタイル割付を相談して、横格子のピッチ割を計画し、出来上がった横格子にタイルを貼って頂いてマグネット固定で納めました。



壁掛け TV 用タイル壁下地状況。




横格子枠切り欠き部のタイル割付の採寸。

確定図 2F TVリコン部横格子


S=1/3

シナ合板t24 横格子正面図

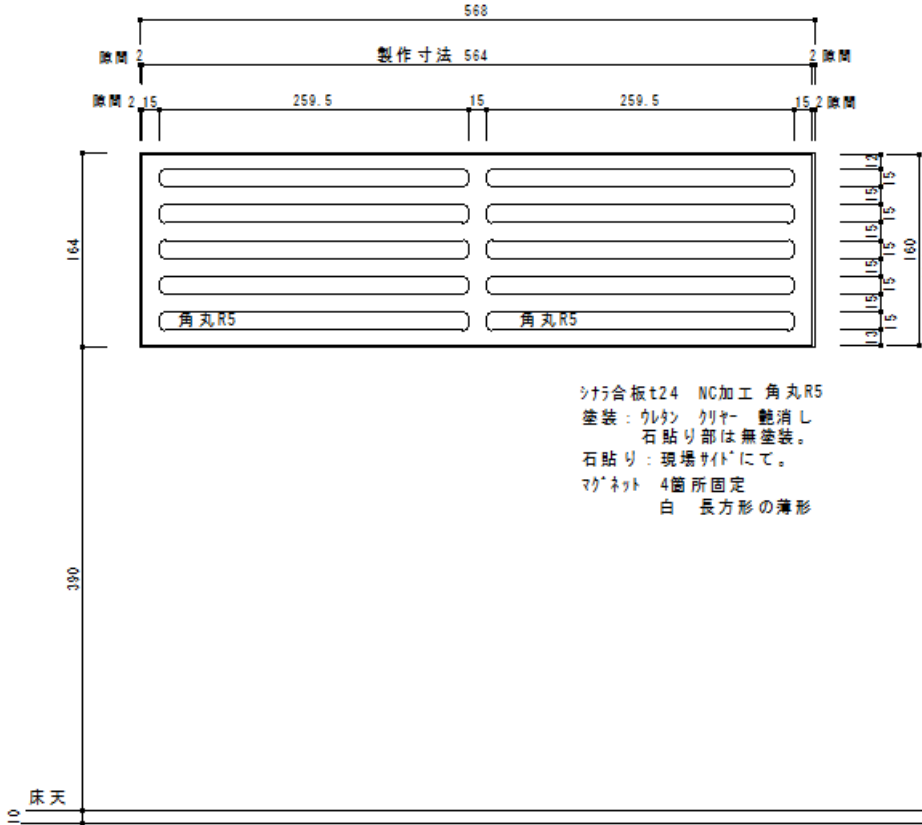

シナ合板t24 NC加工 角丸R5
 塗装：ウレタン クリアー 艶消し
 石貼り部は無塗装。
 石貼り：現場サドにて。
 マグネット 4箇所固定
 白 長方形の薄形

断面図

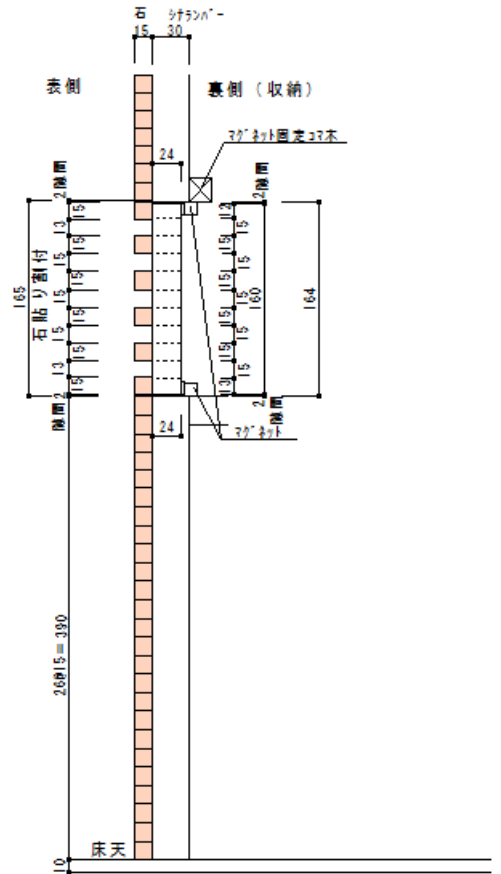


(株)マルタィ 家具部
 平成25年11月18日



T24 シナ合板に NC 加工状況。



NC 加工板へのタイル貼り付け状況。

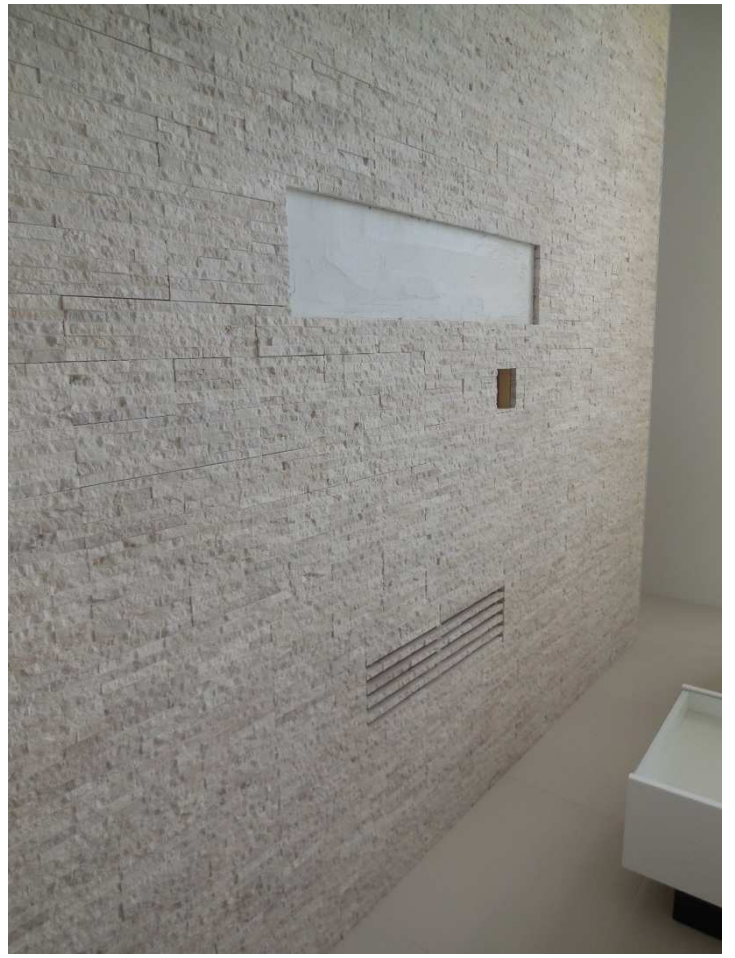

横格子枠はマグネットにて固定します。



タイル壁に納まったオーディオ操作用横格子の完成です。

大変小さな仕事ですが、高価なタイル壁に出来るだけマッチさせた横格子の製作でした。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木

平成 26 年 2 月 3 日
