チーク１枚板 L4400 のダイニングテーブルの製作について

今回の依頼はチーク材１枚天板で L4400 のレストランの特別室用のダイニングテーブルを製作するものです。このチーク材の天板と板脚材は支給品で天板があまりに長尺なため、レストランの建前時に２F の特別室に仕上がった天板のみクレーンにて吊り上げて仮置きしておき、レストランの完成時に組立収めるものです。

したがって、製作期間を１ヶ月として建前１ヶ月前に加工出来るように木取り採寸し、製作図面を確定する必要がありました。

裏面状況。割れあり。

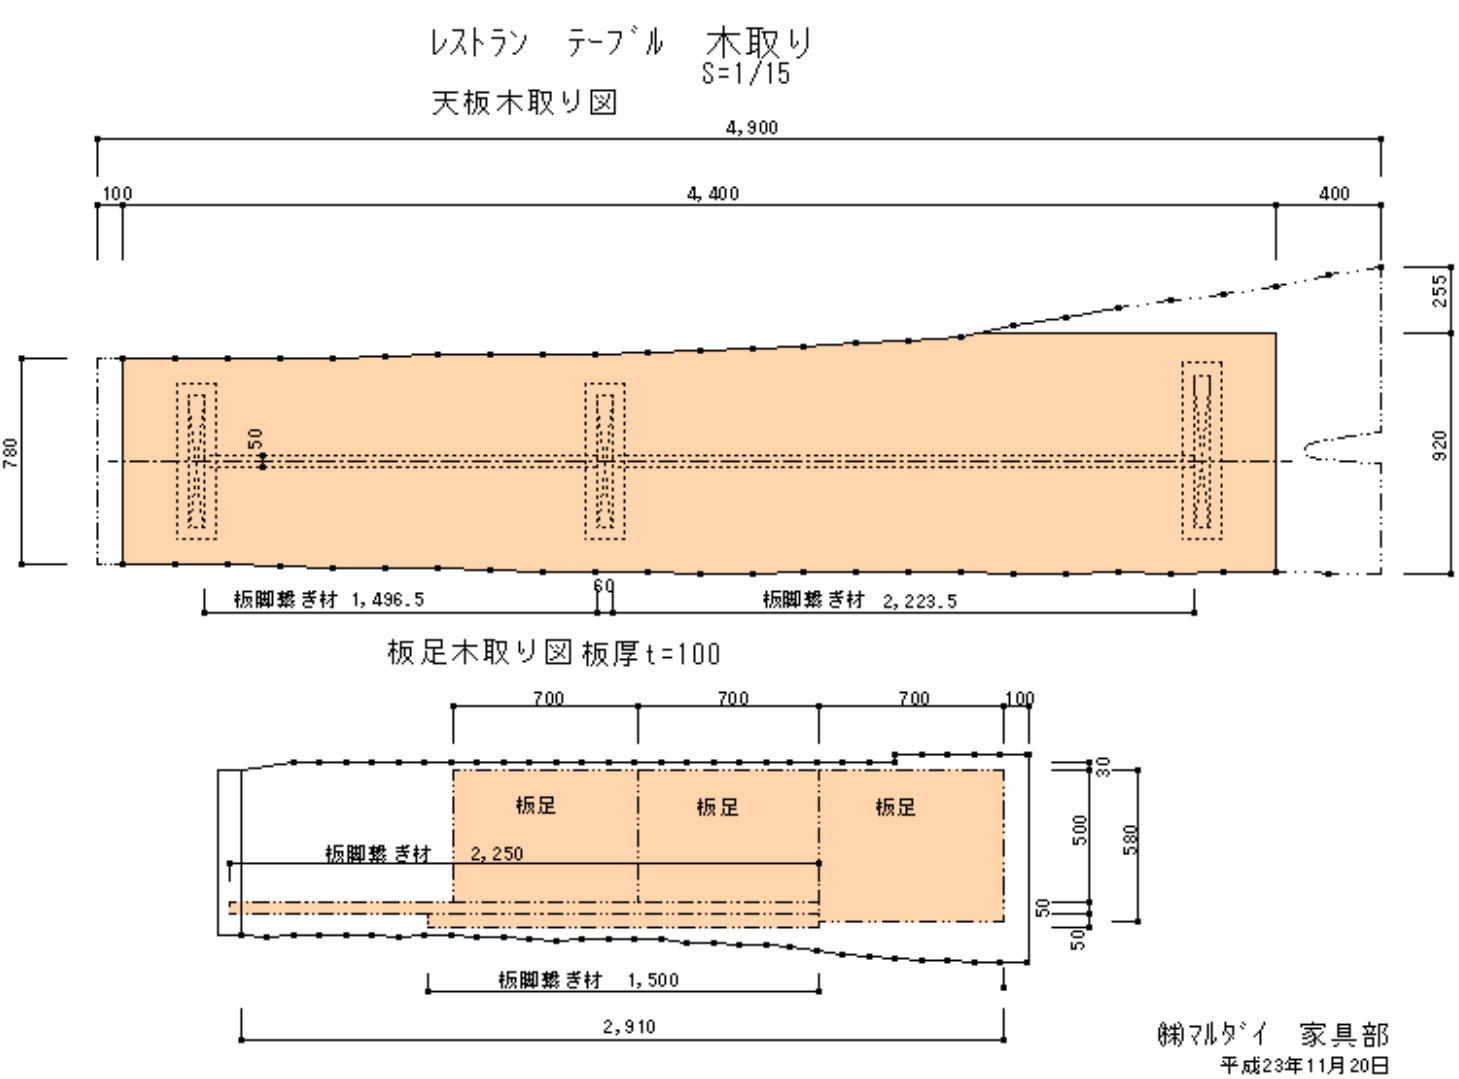

木取り図面より製作図を確定しました。

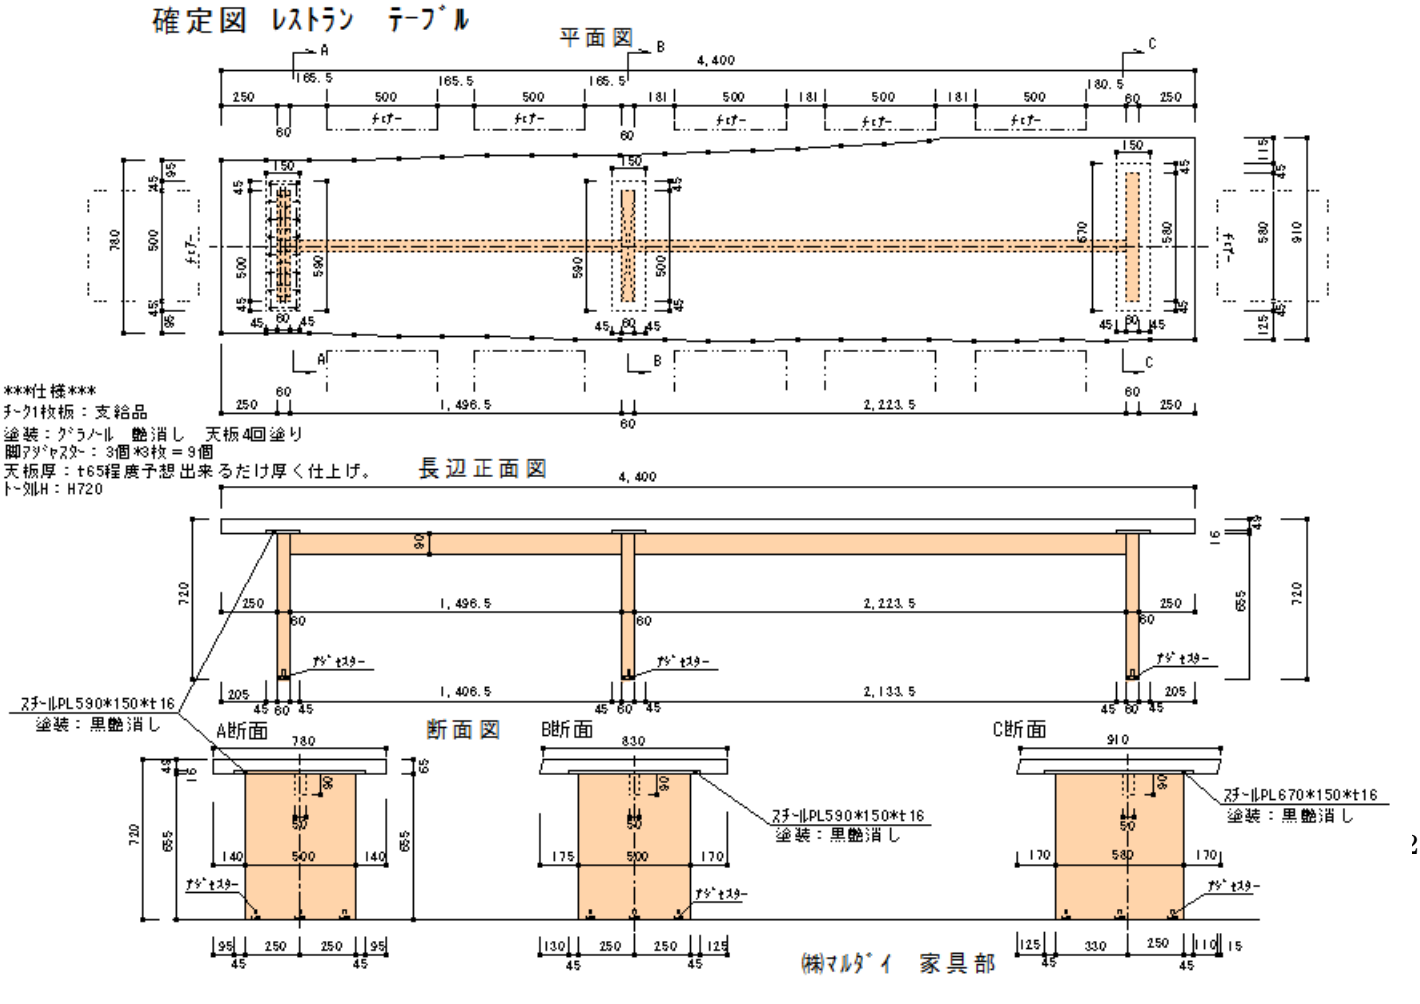

天板仕上げ状況。
耳仕上げ前。
天板は割れ等が無くとても綺麗なチーク材の杢目が出ています。

裏板仕上げ状況。
脚取付けプレートザグリ前。

これで、天板の耳加工、ザグリ加工しガラス塗料のグラノール艶消しを４回塗り、建前時にクレーンにて特別室に入れこみました。

レストランの完成も近づきテーブルの組立に入ります。

板脚にプレートを固定し、プレートを天板のザグリ部に取り付ける。

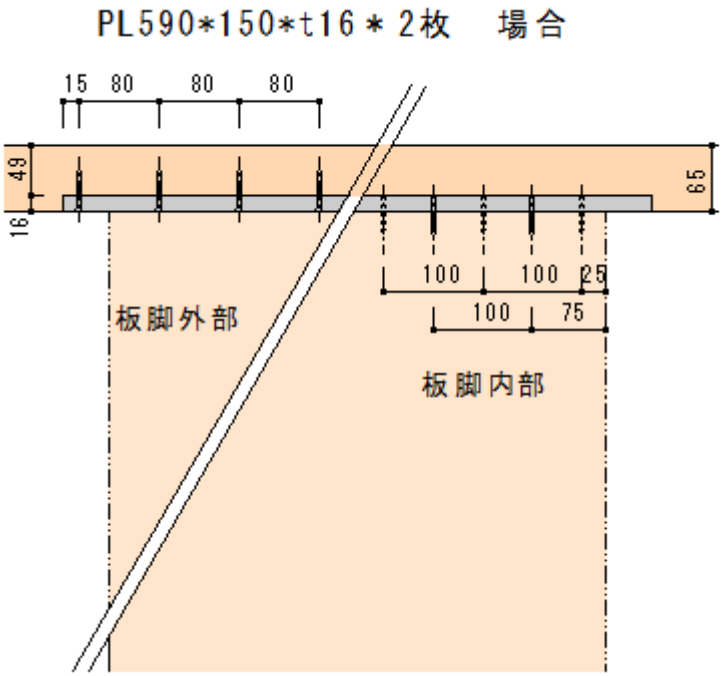

繋ぎ材は天板にビス固定します。

板脚繋ぎ材にプレートをつけて
板脚に固定。

板脚固定完了。

裏返しは余裕みて８人体制にて行いました。

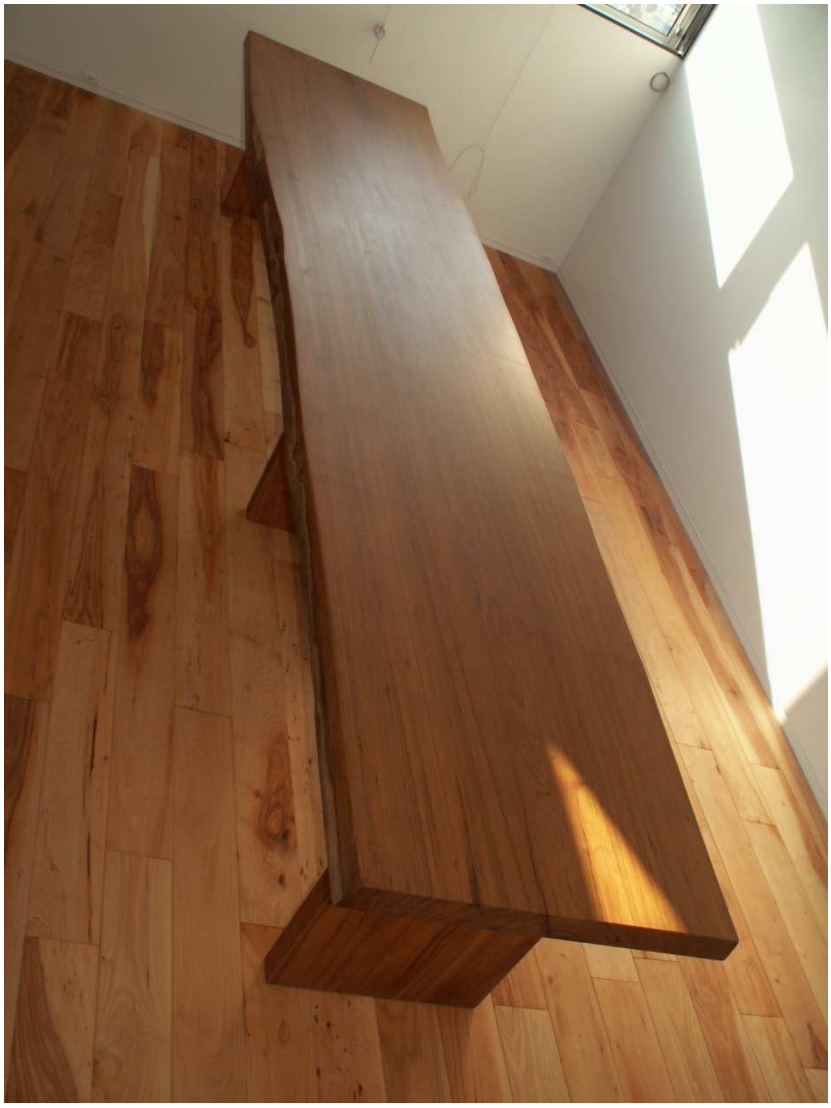

原板では予想出来なかったチーク材の
綺麗な杢目が出ています。

チーク材１枚板 L4400 のダイニングテーブルの完成です。今後、こんな長尺なテーブル製作依頼はないかもしれません。木取りから納品セットまで途中間はあくものの約４ヶ月の長いスパンの家具工事でした。

㈱マルダイ　家具部　Da・monde 鈴木

平成２４年５月７日
